Rapport de mise en œuvre de projet suite à l'aide reçue de la coopérative d'Allons en vent SCRL via son à l'appel à projets du 28 avril 2019 : « SAVE THE CLIMATE – CHANGEONS LE SYSTEME ET NON LE CLIMAT !!! »

Transformers ASBL, transformers.asbl@gmail.com. Contact : Stéphane Winandy, 0499/18.69.80

Résumé du projet déposé lors de l'appel 2019

Porteurs du projet : TransFormers ASBL (association locale de formation à la Transition et de diffusion des savoir-faire liés à la TransFormation alimentaire pour encourager une économie circulaire), en partenariat avec la Régionale Hesbaye Ouest de Natagora, un collectif d'apiculteurs et avec l'appui de l'échevin de l'environnement de la ville de Gembloux.

Localisation : Gembloux, à hauteur du 1a rue de la Posterie

Actions :

- Création et placement de panneaux didactiques sur un parcours de visite à travers la réserve naturelle de l'Escaille, le verger écopâturé et le rucher pédagogique de l'Escaille.
- Végétalisation de la toiture du rucher pédagogique et renforcement de la portance de la structure
- Mise en place d'un système de récupération d'eau de pluie pour abreuver les moutons

Budget accordé : 1.287 € HTVA

Mise en œuvre du projet

L'aide apportée par la coopérative Allons en vent nous a permis d'entreprendre les actions ci-dessous.

Panneau didactique

Un panneau didactique représentant la technique mise en œuvre pour la création de la toiture végétale a été réalisé et imprimé, il sera posé au printemps 2021 au début de la saison apicole. Ci-dessous, le résultat du travail d'Etienne Salvi qui a dessiné et désigné ce panneau.

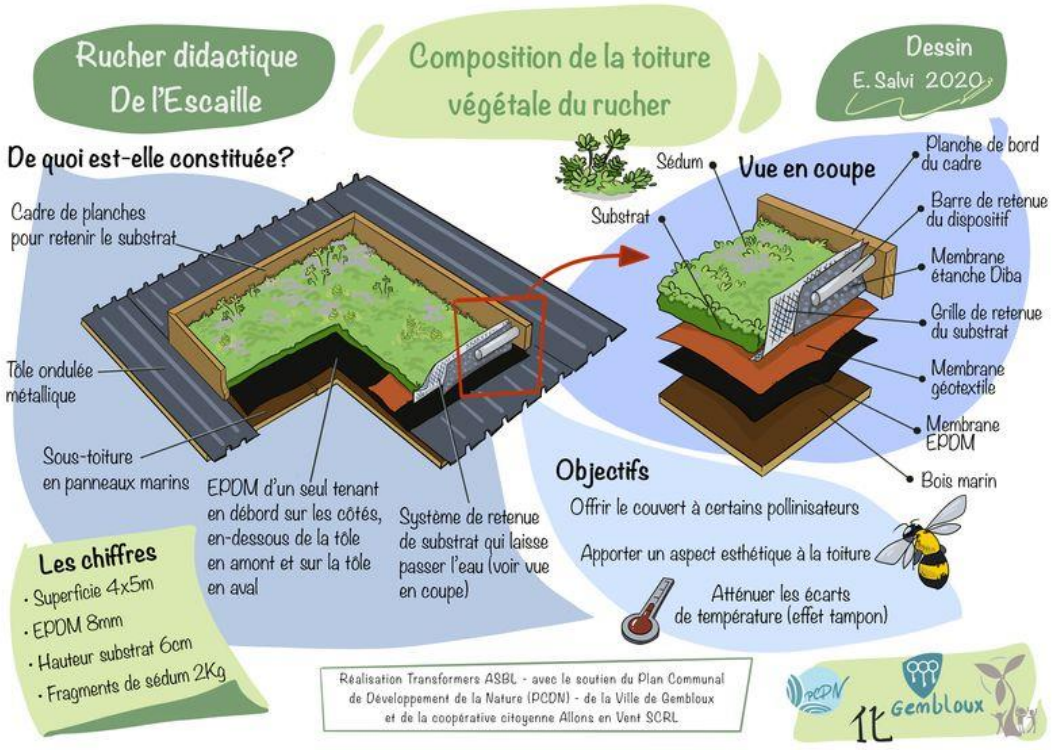

Toiture végétale du Rucher

La plantation de sédum a pu être finalisée en 2019 et nous avons eu une bonne reprise malgré le climat assez sec.

Reprise des fragments de sédums semés sur la toiture du rucher.

Nous avons également remplacé une vitre d'un des châssis de la zone d'observation en travaillant avec un fournisseur local pour la vitre (Miroiterie Jamboise) et en mettant en œuvre une technique de production du mastique à base d'huile de lin et de chaux.

Réparation de la vitre cassée avec confection d'un mastic maison.

Le renfort de la charpente du rucher s'est terminée à l'hiver 2020 avec un peu de retard sur le planning initial. Il n'est pas aisé d'entreprendre des travaux de menuiserie pendant la période de travail des abeilles ☺.

Pose de plots en bétons et sabots pour les futurs poteaux. Taille des pièces de charpentes.

Pose des poteaux et de chevrons supplémentaires.

Nous avons également pu réparer certaines parties de ruche qui devaient être remplacées suite à l'usure naturelle du bois, cela permettra un meilleur hivernage aux abeilles.

Abri à moutons

Nous avons pu terminer l'abri à moutons, notamment via la pose d'une gouttière et le création d'un système de récupération d'eau de pluie, ainsi que la pose d'un abreuvoir.

L'abri à moutons avec son système de récupération d'eau de pluie.
